

| 识号 任务模任务 | 各名 称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 前置任务 | 资源名称 | 总成本 | 剩余 |
|---------------|-------------|---------|--|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 情分析平台 | 54 个工作日 | 2020年11月1 | 0 2021年1月 | 储备[¥8,500.00] | ¥95, 200, 00 | ¥95, 200. 00 |
| | 启动 | | 2020年11月1 | | 间接成本[¥400.00] | | ¥5, 200. 00 |
| • = | 组件核心团队 | | ?2020年11月10 | | 项目经理,UI专家,设计专家 | | ¥1,800.00 |
| -3 | 干系人分析 | 1 个工作日 | ?2020年11月10 | 0 2020年11月 | 项目经理 | | ¥400.00 |
| · -3 | 里程碑计划 | 1 个工作日 | ?2020年11月1 | 0 2020年11月 | 项目经理 | | ¥400.00 |
| -5 | 制定项目章程 | 1 个工作日 | ?2020年11月1 | 1 2020年11月3,4,5 | 项目经理, UI专家, 测试员1 | ,测 ¥400.00 | ¥400.00 |
| -5 | 项目启动大会 | 1 个工作日 | ?2020年11月1: | 2 2020年11月6 | 项目经理,需求专家,UI专家 | ₹, † ¥1, 800. 00 | ¥1,800.00 |
| - 3 | 规划 | | 32020年11月1 | | 间接成本[¥2,000.00] | | ¥26, 160. 00 |
| * | 规划范围 | 18 个工作日 | 32020年11月1 | 3 2020年12月 | | ¥9, 600. 00 | ¥9, 600. 00 |
| -5 | 制定需求说明书 | 10 个工作日 | 2020年11月1 | 3 2020年11月7 | 需求专家 | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 |
| -5 | 界面设计 | 5 个工作日 | 2020年11月2 | 7 2020年12月10 | UI专家 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 |
| -5 | 详细设计说明书 | | | 7 2020年12月10 | 设计专家 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 |
| -5 | 范围说明书 | | | 7 2020年12月10 | 项目经理 | ¥1, 200. 00 | ¥1, 200. 00 |
| -5 | 创建WBS | | | 日2020年12月11,12, | | | ¥800.00 |
| - 5 | 形成范围基准 | | | 日2020年12月14 | 项目经理 | | ¥400.00 |
| -5 | 规划时间 | | 2020年12月9 | | | | ¥2, 800. 00 |
| - | 排列工作包顺序 | | | 日2020年12月15 | 项目经理 | | ¥400.00 |
| -5 | 估算资源 | | | 0 2020年12月17 | 项目经理 | | ¥800.00 |
| - 5 | 估算持续时间 | | | 4 2020年12月18 | 项目经理 | | ¥800.00 |
| - 5 | 制定进度计划 | | | 6 2020年12月19 | 项目经理 | | ¥400.00 |
| <u> </u> | 形成制度基准 | | | 7 2020年12月20 | 项目经理 | | ¥400.00 |
| -5 | 规划成本 | | 52020年12月1 | | | | ¥2, 400. 00 |
| 3 | 项目成本估算 | | | 8 2020年12月21 | 项目经理 | - | ¥1, 200. 00 |
| -5 | 项目预算 | | | 3 2020年12月23 | 项目经理 | | ¥800.00 |
| -5 | 形成范围基准 | | | 5 2020年12月24 | 项目经理 | | ¥400.00 |
| -5 | 规划质量 | | 2020年12月9 | | | | ¥2, 560. 00 |
| -5 | 制定测试计划 | | | E2020年12月15 | 质量专家 | | ¥640.00 |
| -5 | 制定测试用例 | | | 1 2020年12月27 | 质量专家 | | ¥1, 920. 00 |
| -5 | 规划人力资源 | | 2020年12月1 | | | | ¥1, 600. 00 |
| - -5 | 制定人力资源 | | | 4 2020年12月18 | 项目经理 | | ¥800.00 |
| i =3 | 制定人员配备管理计 | | | 2020年 30 | 项目经理 | | ¥800.00 |
| 5 | 规划沟通 | | 2020年12月1 | | | | ¥800.00 |
| i =3 | 制定沟通管理计划 | | 2020年12月 | 2020年 31 | 项目经理 | | ¥800.00 |
| -5 | 规划采购 | 7 个工作日 | 2020年12月1 | 4 2020年12月 | | ¥2, 800. 00 | ¥2, 800. 00 |
| | 任务 | | 非活动任务 | <u> </u> | 手动摘要总成 | 外部里程碑 ◇ | |
| | 拆分 | | 非活动里科 | 呈碑 ◇ | | 最后期限 ♣ | |
| 目: 王蕴韬 | 里程碑 | • | 非活动摘要 | | | 进度 ——— | |
| 期: 2020年12月8日 | 主任呼 摘要 | | 非商幼摘多● 手动任务 | 4 | | 手动进度 | |
| | 项目摘要 | - | 又工期 | | 外部任务 | | |
| | 75日周女 | | · IV—1//1 | 398 | / I HP I L // | | |

| 示识号 | 任务模 任务名称 | | 工期 | 开始时间 | 分 | 尼成时间 | 前置任务 | 资源名称 | | 总成本 | 剩余 |
|--------|-------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|---------|------|--|-----------|-----------|------------------------------|
| 35 | | 卜 购分析 | 2 个工作 | 乍日 2020年 | 12月142 | 020年12月 | 18 | 项目经理 | | ¥800. | 00 ¥800. 00 |
| 36 | | 兴购文件 | | 乍日 2020年 | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | 00 ¥2, 000. 00 |
| 37 | 规划风险 | | | 乍日:2020年 | | | | | | | 00 ¥1, 200. 00 |
| 38 | 识别区 | | | 乍日?2020年 | | | | 2项目经理 | | | 00 ¥400. 00 |
| 39 | 风险分 | ·析 | | 乍日?2020年 | | | | 项目经理 | | ¥400. | 00 ¥400. 00 |
| 40 | | L 险登记册 | | 乍日?2020年 | | | | 项目经理 | | ¥400. | 00 ¥400. 00 |
| 41 | 规划整合 | | | 乍日?2020年 | | | | 项目经理 | | ¥400. | 00 ¥400.00 |
| 42 | 执行与监控 | 3 | 16 个工 | 作日2021年 | 1月1日2 | 021年1月 | | 间接成本[¥4, | 000.00] | ¥55, 340. | 00 ¥55, 340. 00 |
| 43 | 4件项目 | 团队 | 2 个工作 | 乍日 2021年 | 1月1日 2 | 021年1月 | 8 | 项目经理,测 | 武员1,测试员2, | ¥5,000. | 00 ¥5, 000. 00 |
| 44 | ■ 项目执行 | : | 12 个工 | 作日2021年 | 1月5日 2 | 021年1月 | | | | ¥9, 950. | 00 ¥9, 950. 00 |
| 45 | 用户模 | 模块 | 12 个工 | 作日2021年 | 1月5日 2 | 021年1月 | | | | ¥5, 700. | 00 ¥5, 700. 00 |
| 46 | 注册 | }登录 | 1 个工作 | 乍日?2021年 | 1月5日 2 | 021年1月 | 43 | 程序员1 | | ¥500. | 00 ¥500.00 |
| 47 | 二 首页 | | | 乍日 2021年 | | | | 程序员1 | | ¥500. | 00 ¥500.00 |
| 48 | | 魚情浏览 | | 乍日?2021年 | | | | 程序员1 | | | 00 ¥500.00 |
| 49 | | 字事件 | | 乍日?2021年 | | | | 程序员1 | | | 00 ¥500.00 |
| 50 | 事件 | 丰评论浏览 | | 乍日?2021年 | | | | 程序员1 | | ¥500. | 00 ¥500.00 |
| 51 | | 身分析 | | 乍日 2021年 | | | | 程序员2 | | ¥900. | 00 ¥900.00 |
| 52 | 具情 | | | 乍日 2021年 | | | | 程序员2 | | | 00 ¥450.00 |
| 53 | | 身处理建议 | | 乍日 2021年 | | | | 程序员2 | | ¥1, 350. | 00 ¥1, 350.00 |
| 54 | | 、配置 | 1 个工作 | 乍日?2021年 | 1月20日2 | 021年1月 | 53 | 程序员1 | | ¥500. | 00 ¥500.00 |
| 55 | 雪 管理员 | ↓模块 | 9 个工作 | 乍日;2021年 | 1月5日 2 | 021年1月 | | | | ¥4, 250. | 00 ¥4, 250. 00 |
| 56 | | 青爬取 | | 乍日 2021年 | | | 43 | 程序员1 | | | 00 ¥1,000.00 |
| 57 | | | 1 个工作 | | 1月7日 2 | | 56 | 程序员1 | | | 00 ¥500.00 |
| 58 | | ₅ 分析设置 | | 乍日 2021年 | | | | 程序员2 | | ¥900. | 00 ¥900.00 |
| 59 | | 魚情设置 | | 乍日 2021年 | | | 58 | 程序员2 | | ¥900. | 00 ¥900.00 |
| 60 | | 中使用情况分析 | | | | 021年 | 59 | 程序员2 | | ¥450. | 00 ¥450.00 |
| 61 | 备份 | | 1 个工作 | 乍日?2021年 | 1月15日2 | 021年1月 | 60 | 程序员1 | | ¥500. | 00 ¥500.00 |
| 62 | ■ 项目监挡 | | 3 个工作 | 乍日;2021年 | 1月5日 2 | 021年1月 | | | | ¥7, 210. | 00 ¥7, 210. 00 |
| 63 | ■ 各项指 | f标监控 | 1 个工作 | 乍日?2021年 | 1月5日 2 | 021年1月 | 43 | | 经理,测试员2 | | 00 ¥1, 130. 00 |
| 64 | 些控羽 监控羽 | | | 乍日?2021年 | | | | | 目经理, 需求专家 | | $00 \text{\}1,480.00$ |
| 65 | 变更识 | 审 | | 乍日?2021年 | | | | | 目经理, 需求专家 | | 00 ¥1, 480. 00 |
| 66 | 妈 会 | | | 乍日?2021年 | | | 43 | UI专家,测试 | 员1,测试员2,程 | | 00 \(\frac{1}{2}\)3, 120. 00 |
| 67 | ■ 管理干系 | | | 乍日?2021年 | | | | | | | 00 ¥1, 200. 00 |
| 68 | 发布项 | 同信息 | 1 个工作 | 乍日?2021年 | 1月5日 2 | 021年1月 | 43 | 项目经理 | | ¥400. | 00 ¥400.00 |
| | | 任务 | | 11年3 | 舌动任务 | | # | 动摘要总成 | 外音 | 部里程碑 ◇ | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目: 王頦 | 蓝 韬 | 拆分 | | | 舌动里程碑 5 动 宝玉 | | | 动摘要 | | | |
| | 20年12月8日 | 里程碑 | ♦ | 非 | 舌动摘要 | I | 1 位 | 【开始时间 □ | 进 | 要 | |
| ,,,,,, | , -= /4 × F3 | 摘要 | | 手克 | 动任务 | | 乜 | [完成时间] | 手克 | 动进度 —— | |
| | | 项目摘要 | | ▮ 仅3 | 工期 | | Я | ·部任务 | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |

| 标识号 | 任务模 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 总成本 | 剩余 |
|-----|--------------|---------|--------------------|---------|------|------------------|--------------|--------------|
| 69 | 报告监控指标 | 1 个工作日 | ?2021年1月5日 | 2021年1月 | 43 | 项目经理 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 70 | 干系人沟通 | 1 个工作日 | ?2021年1月5日 | 2021年1月 | 43 | 项目经理 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 71 | 团队建设 | 1 个工作日 | ?2021年1月5日 | 2021年1月 | | | ¥12, 360. 00 | ¥12, 360. 00 |
| 72 | 培训 | 1 个工作日 | ?2021年1月5日 | 2021年1月 | 43 | UI专家,测试员1,测试员2,程 | ¥5, 120. 00 | ¥5, 120.00 |
| 73 | 娱乐活动 | 1 个工作日 | ?2021年1月5日 | 2021年1月 | 43 | UI专家,测试员1,测试员2,程 | ¥4, 120. 00 | ¥4, 120.00 |
| 74 | > 沟通 | 1 个工作日 | ?2021年1月5日 | 2021年1月 | 43 | UI专家,测试员1,测试员2,程 | ¥3, 120. 00 | ¥3, 120.00 |
| 75 | - 采购 | 10 个工作日 | 日2021年1月5日 | 2021年1月 | 43 | 项目经理 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 |
| 76 | 项 目验收 | 1 个工作日 | ?2021年1月21日 | 2021年1月 | 44 | | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 |
| 77 | ■ 收尾 | 1 个工作日 | ?2021年1月22日 | 2021年1月 | | 间接成本[¥500.00] | ¥5, 820. 00 | ¥5, 820. 00 |
| 78 | 项目终验 | 1 个工作日 | ?2021年1月22日 | 2021年1月 | 76 | UI专家,设计专家,项目经理, | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 |
| 79 | 4 | 1 个工作日 | ?2021年1月22日 | 2021年1月 | 76 | 项目经理 | ¥400.00 | ¥400.00 |
| 80 | 项目内部收尾 | 1 个工作日 | ?2021年1月22日 | 2021年1月 | 76 | UI专家,测试员1,测试员2,程 | ¥3, 120. 00 | ¥3, 120.00 |



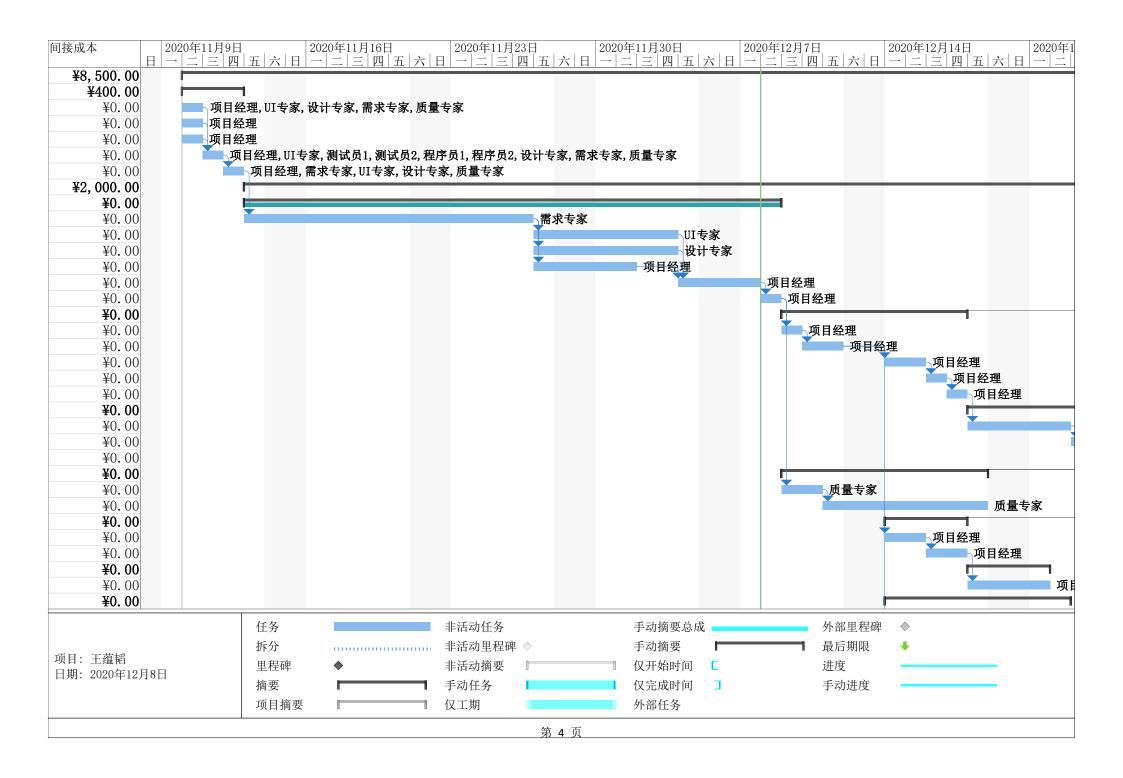

| 间接成本 | 20 H — | 20年11月9 | 日 四 五 - | 六月 | 2020年1 | 1月16日 | 5 六 日 | 2020年 | 11月23日 | | 2020年1 | 1月30日 | 六 日 | 2020 | 0年12月7 = [| 日 五 五 | 六 日 | 2020年 | 12月14日 三 四 五 | 六 日 | 2020年1 |
|----------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|----------|-----------|-------------|------------------|-----|--------|----------|-----------------|------|-------------------|----------|----------|----------------|------------------|-------|--------|
| ¥0.00 | H | <u> </u> | <u> </u> | / , H | | <u> </u> | <u> </u> | · · · · · · | <u> </u> | | | F 14. | 1/ 1 H | | <u> </u> | <u> </u> | 17 V H | | 项目经理 | 1711 | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥4, 000. 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 任 | 务 | | | | 非活动任 | 务 | | 手 | 动摘要总 | 成 | | | 外音 | 『里程碑 | \langle | | | |
| | | | 拆 | | 11111 | | | 非活动里 | | | | 动摘要 | | | | | 与期限 | + | | | |
| 项目: 王蕴韬 | | | | 程碑 | ♦ | | | 非活动摘 | | | | 开始时间 | Е | | | 进度 | | | | _ | |
| 日期: 2020年12 | 月8日 | | 摘 | | | | | 手动任务 | | | | 完成时间 | | | | | 力进度 | | | _ | |
| | | | | へ 目摘要 | _ | | | 仅工期 | | | | 部任务 | _ | | | • • | | | | | |
| | | | | 山門文 | ш | | | V-1-/91 | (1)22 | | | HY IT // | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ラ | 95页 | | | | | | | | | | | |

| 间接成本 2020年11月9日 日 - 二 三 四 | |)20年11月16日 · 二 三 四 五 六 F | 2020年11月23日 二 三 四 五 六 日 | 2020年11月30日 = 四 五 六 E | 2020年12月7日 | | 2020年12月14日 一 二 三 四 五 | 2020年1 |
|------------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|----------------------------------|--------|
| ¥0.00 | <u> </u> | <u> </u> | | | | 111/1/1 | | 71 |
| ¥0.00 | | | | | | | | |
| ¥0. 00 | | | | | | | | |
| ¥0.00 ¥0.00 | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | |
| ¥500. 00 ¥0. 00 | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | |
| ¥0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 任务 | | 非活动任务 | 手动摘要总成 —— | | 外部里程碑 | | |
| | 拆分 | | 非活动里程碑 ◇ | 手动摘要 | | 最后期限 | • | |
| 项目: 王蕴韬 | 里程碑 | ♦ | 非活动摘要 『 | □ 仅开始时间 □ | | 进度 | | _ |
| 日期: 2020年12月8日 | 摘要 | | 手动任务 | 仅完成时间] | | 手动进度 | | _ |
| | 项目摘要 | | 仅工期 | 外部任务 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 第 6 页 | | | | | |

